

















■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 建設工事進捗状況写真①

《定点撮影》

							
No.1	令和3年3月撮影(敷地南西側から)	工事種別	着工前	No.2	令和3年3月撮影(敷地北東側から)	工事種別	着工前
状況	着工前・造成完了状況			状況	着工前・造成完了状況		
							
No.3	令和3年4月撮影(敷地南西側から)	工事種別	仮設工事	No.4	令和3年4月撮影(敷地北東側から)	工事種別	仮設工事
状況	仮設工事(鉄板敷・敷地外周仮囲い)			状況	仮設工事(鉄板敷・敷地外周仮囲い)		





							
No.5	令和3年5月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎工事	No.6	令和3年5月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎工事
状況	地業工事(杭工事)			状況	地業工事(杭工事)		
							
No.7	令和3年6月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎工事	No.8	令和3年6月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎工事
状況	地業工事(杭工事)			状況	地業工事(杭工事)		


							
No.9	令和3年7月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎・土工事	No.10	令和3年7月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	地業・土工事 (杭工事完了・ごみピット1次掘削工事)			状況	地業・土工事 (杭工事完了・ごみピット1次掘削工事)		
							
No.11	令和3年8月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎・土工事	No.12	令和3年8月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	地業・土工事 (山留工事・ごみピット2次掘削工事)			状況	地業・土工事 (山留工事・ごみピット2次掘削工事)		





							
No.13	令和3年9月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎・土工事	No.14	令和3年9月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	地業・基礎・土工事 (ごみピット3次掘削・基礎工事)			状況	地業・基礎・土工事 (ごみピット3次掘削・基礎工事)		
							
No.15	令和3年10月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎・土工事	No.16	令和3年10月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	基礎工事 (ごみピット掘削完了・基礎工事)			状況	基礎工事 (ごみピット掘削完了・基礎工事)		





■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 建設工事進捗状況写真⑤





《定点撮影》





							
No.17	令和3年11月撮影(敷地南西側から)	工事種別	地業・基礎・土工事	No.18	令和3年11月撮影(敷地北東側から)	工事種別	地業・基礎・土工事
状況	工場棟・管理棟基礎工事、調整池築堤工事			状況	工場棟・管理棟基礎工事、調整池築堤工事		
							
No.19	令和3年12月撮影(敷地南西側から)	工事種別	基礎・コンクリート工事	No.20	令和3年12月撮影(敷地北東側から)	工事種別	基礎・コンクリート工事
状況	工場棟・管理棟基礎工事、調整池擁壁工事			状況	工場棟・管理棟基礎工事、調整池擁壁工事		

							
No.21	令和4年1月撮影(敷地南西側から)	工事種別	基礎・コンクリート工事	No.22	令和4年1月撮影(敷地北東側から)	工事種別	基礎・コンクリート工事
状況	工場棟・管理棟基礎工事、調整池擁壁工事			状況	工場棟・管理棟基礎工事、調整池擁壁工事		
							
No.23	令和4年2月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨工事・基礎コンクリート工事	No.22	令和4年2月撮影(敷地北東側から)	工事種別	鉄骨工事・基礎コンクリート工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・基礎工事)、管理棟土間工事、調整池排水塔工事			状況	工場棟(鉄骨建て方・基礎工事)、管理棟土間工事、調整池排水塔工事		

							
No.25	令和4年3月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨工事・基礎コンクリート工事	No.26	令和4年3月撮影(敷地北東側から)	工事種別	鉄骨工事・基礎コンクリート工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・基礎工事)、管理棟土間工事、調整池排水塔工事			状況	工場棟(鉄骨建て方・基礎工事)、管理棟土間工事、調整池排水塔工事		
							
No.27	令和4年4月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨工事・コンクリート工事	No.28	令和4年4月撮影(敷地北東側から)	工事種別	鉄骨工事・コンクリート工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・ごみピットコンクリート壁、プラント設備工事) 管理棟土間工事、調整池築堤・排水塔工事			状況	工場棟(鉄骨建て方・ごみピットコンクリート壁、プラント設備工事) 管理棟土間工事、調整池築堤・排水塔工事		





			
No.29 令和4年5月撮影(敷地南西側から)	工事種別 鉄骨工事・コンクリート工事	No.30 令和4年5月撮影(敷地北東側から)	工事種別 鉄骨工事・コンクリート工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・ごみピットコンクリート壁、プラント設備工事) 調整池築堤・排水塔工事	状況	工場棟(鉄骨建て方・ごみピットコンクリート壁、プラント設備工事) 調整池築堤・排水塔工事
			
No.31 令和4年6月撮影(敷地南西側から)	工事種別 鉄骨工事・コンクリート工事・ プラント設備工事	No.32 令和4年6月撮影(敷地北東側から)	工事種別 鉄骨工事・コンクリート工事・ プラント設備工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・ごみピットコンクリート壁、プラント設備工事) 調整池築堤・排水塔工事	状況	工場棟(鉄骨建て方・ごみピットコンクリート壁、プラント設備工事) 調整池築堤・排水塔工事

			
No.33	令和4年7月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨工事・コンクリート工事・ プラント設備工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・外壁ALCパネル取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント設備工事)計量棟(基礎工事)調整池法面・制御棟工事		
			
No.35	令和4年8月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨工事・コンクリート工事・ プラント設備工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・外壁ALCパネル取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント設備工事)計量棟(基礎工事)調整池法面・制御棟工事		
No.36	令和4年8月撮影(敷地北東側から)	工事種別	鉄骨工事・コンクリート工事・ プラント設備工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・外壁ALCパネル取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント設備工事)計量棟(基礎工事)調整池法面・制御棟工事		

			
No.37	令和4年9月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨・コンクリート工事・プラント 設備工事・内外装工事
状況	工場棟(鉄骨建て方・外壁ALCパネル取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント設備工事)、調整池遮水シート工事		
			
No.39	令和4年10月撮影(敷地南西側から)	工事種別	鉄骨・コンクリート工事・プラント 設備・内外装工事
状況	工場棟(煙突鉄骨・外壁ALCパネル取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント・建築設備工事)、管理棟鉄骨工事、調整池管理通路工事		
No.40	令和4年10月撮影(敷地北東側から)	工事種別	鉄骨・コンクリート工事・プラント 設備・内外装工事
状況	工場棟(煙突鉄骨・外壁ALCパネル取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント・建築設備工事)、管理棟鉄骨工事、調整池管理通路工事		




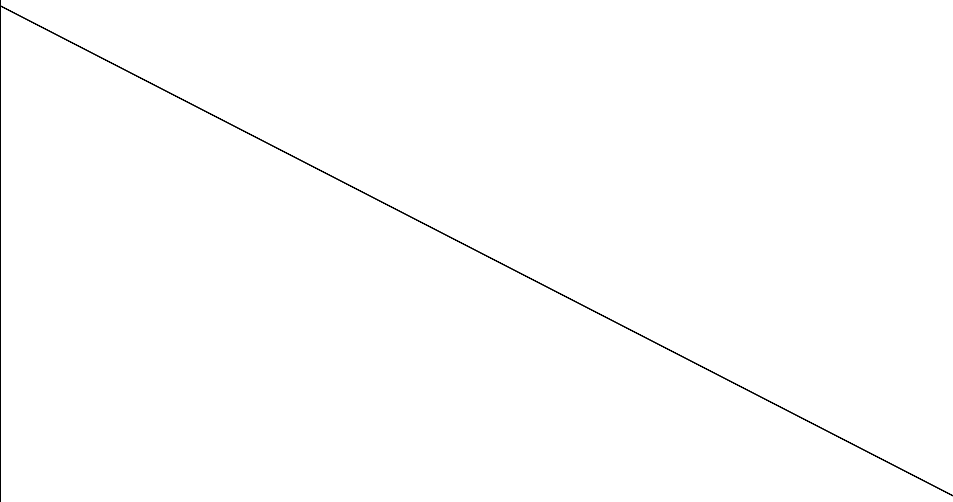
■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 建設工事進捗状況写真⑪

《定点撮影》

							
No.41	令和4年11月撮影(敷地南西側から)	工事種別	コンクリート工事・プラント設備・ 内外装工事	No.42	令和4年11月撮影(敷地北東側から)	工事種別	コンクリート工事・プラント設備・ 内外装工事
状況	工場棟(外壁塗装・サッシ取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント・建築設備工事)、管理棟屋根・外壁工事、調整池工事完了			状況	工場棟(外壁塗装・サッシ取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント・建築設備工事)、管理棟屋根・外壁工事、調整池工事完了		
							
No.43	令和4年12月撮影(敷地南西側から)	工事種別	コンクリート工事・プラント設備・ 内外装工事	No.44	令和4年12月撮影(敷地北東側から)	工事種別	コンクリート工事・プラント設備・ 内外装工事
状況	工場棟(外壁塗装・サッシ取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント・建築設備工事)、管理棟内外装工事、調整池工事完了			状況	工場棟(外壁塗装・サッシ取付・ごみピットコンクリート壁、 プラント・建築設備工事)、管理棟内外装工事、調整池工事完了		

■高萩市・北茨城市広域ごみ処理施設施設整備事業 建設工事進捗状況写真⑫

《定点撮影》

							
No.45	令和5年1月撮影(敷地南西側から)	工事種別	建築内外装工事 プラント設備工事	No.46	令和5年1月撮影(敷地北東側から)	工事種別	建築内外装工事 プラント設備工事
状況	工場棟(外壁塗装・サッシ取付・ごみピットコンクリート壁、プラント・建築設備工事)、管理棟内外装工事、調整池工事完了			状況	工場棟(外壁塗装・サッシ取付・ごみピットコンクリート壁、プラント・建築設備工事)、管理棟内外装工事、調整池工事完了		
							
No.47	令和5年4月撮影(敷地南西側から)	工事種別	建築工事 外構工事				
状況	工場棟・管理棟・計量棟完成(施設稼働) 外構工事中(駐車場・敷地内通路舗装、緑地整備)			状況			



No.49	令和5年8月撮影(敷地南西側から)	工事種別	外構工事	No.50	令和5年8月撮影(敷地北東側から)	工事種別	外構工事
状況	外構工事 完成 《ごみ処理施設 稼働中》			状況	外構工事 完成 《ごみ処理施設 稼働中》		
(Empty area with diagonal line)				(Empty area with diagonal line)			
No.51		工事種別		No.52		工事種別	
状況				状況			
